

Grøn Trepert

Fra principvedtaget plan til afklarede projekter


HOVEDVURDERING

Planen er principvedtaget, og offentlige kilder dokumenterer enkelte forberedende aktiviteter og tværkommunalt kapacitetssamarbejde. De fastslår ikke, hvilke af de 21 skitser der samlet er prioriteret eller realiseret. For lavbundsprojektet Trundholm Mose foreligger tilsagn til realisering, men PFAS-analyser afventes, og jordfordelingen er sat på pause med forventet genoptagelse i januar 2027.

STATUS PÅ KONTROLDATOEN

1. Omlægningsplanen rummer 21 større projektskitser og er dynamisk. Odsherred Byråd principvedtog planen 16. december 2025.
2. Den offentliggjorte næste fase er at prioritere, hvilke skitser der skal videre til tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser.
3. Lodsejerdeltagelse er frivillig, og arealomlægning kræver frivillige aftaler.
4. Holbæk og Odsherred har igangsat en indledende analyse af Lammefjorden. En pulje åbner desuden for fælles forundersøgelser med Samsø og Lejre.

BESLUTNINGEN STARTER EN IMPLEMENTERINGSKÆDE



Hvert trin kræver sit eget dokumenterede beslutnings- eller kontrolpunkt.

TRE AFHÆNGIGHEDER FØR REALISERING


- 1. Prioritering.** Der er ikke offentliggjort en samlet formel prioriteringsliste. Næste kontrol: når en prioriteringsstatus foreligger.
- 2. Forundersøgelse.** Der er dokumenteret indledende analyse af Lammefjorden, men ikke afsluttede forundersøgelser for alle skitser. Næste kontrol: ved offentliggjort projektstatus.
- 3. Frivillige aftaler.** Lodsejerdeltagelse er frivillig; kontakt og interesse er ikke det samme som en aftale. Næste kontrol: ved offentliggjort aftalestatus.

TRUNDHOLM SKAL FØLGES SOM SIT EGET PROJEKTSFOR

Dokumenteret status. Trundholm Mose har tilsagn til realisering. PFAS-analyser afventes, og jordfordelingen er sat på pause med forventet genoptagelse i januar 2027. Jord- og tekniske arbejder afventer endelige lodsejraftaler. Næste kontrol er januar 2027 eller en tidligere officiel statusændring.

ANALYTISK OPFØLGINGSRAMME

Opfølgingsrammen skelner mellem det udførte arbejde, det leverede grundlag, den faktiske gennemførelse og den senere målte effekt.

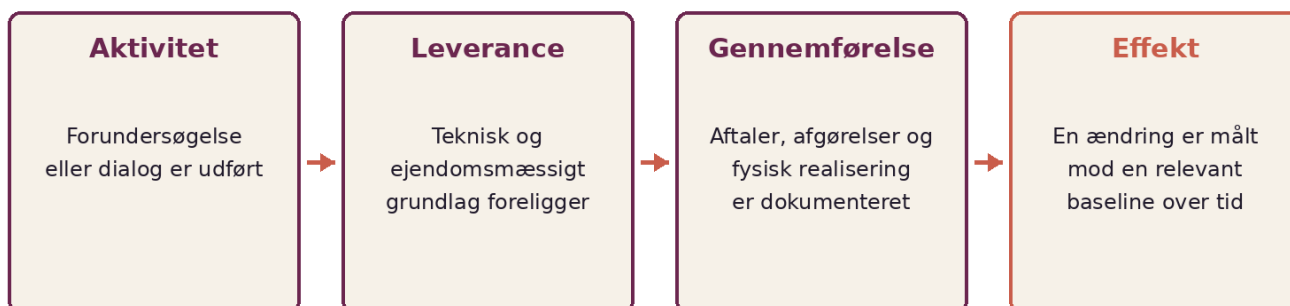

DOKUMENTATIONSKRAV VED HVERT LED

1. Aktivitet: registrér formål, start og afslutning.
2. Leverance: dokumentér konklusioner, forudsætninger og begrænsninger.
3. Gennemførelse: dokumentér aftaler, afgørelser og fysisk realisering særskilt.
4. Effekt: fastlæg baseline, datakilde, målerytme og relevante alternative forklaringer.

NÆSTE KONTROL

1. Hvilke skitser har fået en formel prioriteringsstatus?
2. Hvilke tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser er startet eller afsluttet?
3. Hvornår er PFAS afklaret, jordfordelingen genoptaget og endelige aftaler indgået i Trundholm Mose?
4. Hvilken baseline, datakilde og målerytme skal bruges, før effekt vurderes?

Fortolkningsgrænse. Politisk beslutning er ikke implementering. Aktivitet er ikke effekt. En tidsmæssig sammenhæng dokumenterer ikke i sig selv årsag, og en opfølgingsramme er ikke en gennemført evaluering.

KILDER OG KONTROLDATO

[Omlægningsplan · 8. juni 2026](#) · [Information til lodsejere · 19. februar 2026](#)
[Lokal følgegruppe · 10. juni 2026](#) · [§ 17, stk. 4-udvalget · 5. maj 2026](#)
[Tværkommunal kapacitetspulje · 29. juni 2026](#) · [Trundholm Mose · 12. juni 2026](#)
 Kontrolleret 9. august 2026 · udgiver: Kommuneblik · [kommuneblik.dk](#)
